



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS

Informe ejecutivo

13 de diciembre 2019

1. GESTIÓN DEL PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico DIA's 96- 01 (13/12/2019)

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	DIA - 96	DIA - 01	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico			13.711
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	13.206	200	13.406
Total de viviendas aprobadas por CT/CG para medición e informe	13.102	200	13.302
Proyectos de aislamiento acústico solicitados a los interesados	12.897	200	13.097
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	12.796	199	12.995
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución o finalizado	12.784	199	12.983
Total de viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	12.713	196	12.909
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	71	3	74

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico DIA's 96- 01 (13/12/2019)

En función de los siguientes valores considerados se obtienen dos ratios que definen el grado de ejecución del PAA:

NOTA: Destacar que se ha aprobado por la CSAM la incorporación al Plan de Aislamiento Acústico, en noviembre de 2005, 582 viviendas correspondientes al barrio de la Alemana de Osuna y 250 del Sector I del municipio de San Fernando de Henares.

$$R_1 = \frac{\text{Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución o finalizado: } 12.983}{\text{Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico: } 13.711}$$

94,69% DEL P.A.A. FINALIZADO


$$R_2 = \frac{\text{Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución o finalizado: } 12.983}{\text{Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.: } 12.995}$$

99,91% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2000-2019)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 12.983

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 12.909

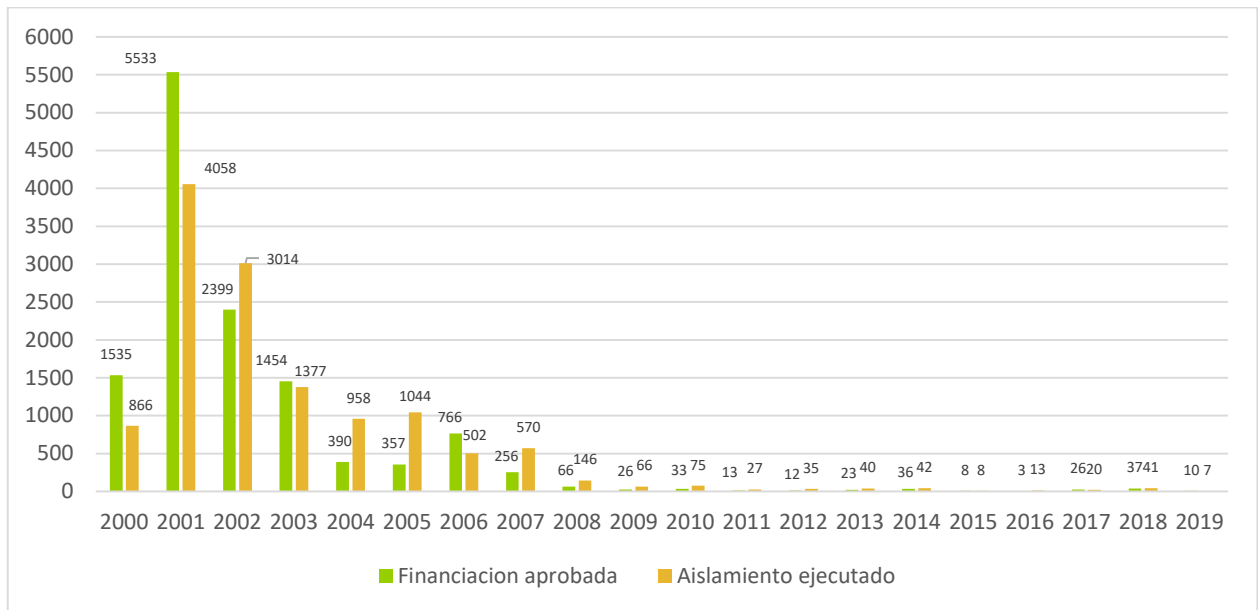

Importe aprobados y pagos efectuados en Mill.€ (2000-2019)

TOTAL IMPORTES APROBADOS 161,03 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS 154,67 Mill. €

