



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE IBIZA

Informe ejecutivo

4 de octubre de 2018

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 01/09/09

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Ibiza	Sant Josep de Sa Talaia	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	359	726	1.085
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	83	648	731
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	82	647	729
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	46	572	618
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	46	568	614
Total de viviendas con financiación aprobada	46	568	614
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	34	25	59
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	12	543	555

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 614}{\text{Total solicitudes recibidas: } 731}$$

83,99% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2011-2018)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 614

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 555

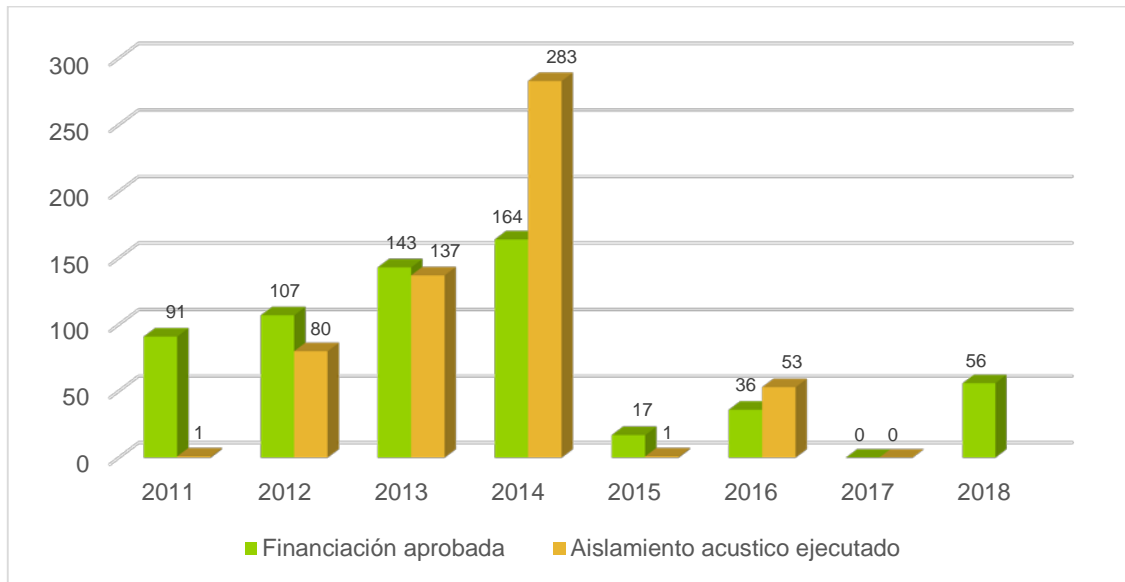

Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2011-2018)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 6.600,66 Mil.

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 5.581,16 Mil.

