



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE VALENCIA

Informe ejecutivo

24 de mayo de 2019

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaraciones de Impacto Ambiental 17/11/2004 y 09/02/2009

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	D.I.A. 2004	Resolución 2009	Ampliación 2018	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1	2.330	2.368	4.699
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1	2.157	1.662	3.820
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1	2.151	1.645	3.797
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1	2.135	349	2.485
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1	2.122	17	2.140
Total de viviendas con financiación aprobada	1	2.072	5	2.078
Total con aislamiento acústico en ejecución	-	110	5	115
Total con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1	1.962	-	1.963

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Declaraciones de Impacto Ambiental 17/11/2004 y 09/02/2009

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:

$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 2.078}{\text{Total solicitudes recibidas: } 3.820}$$

54,40% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2008-2019)

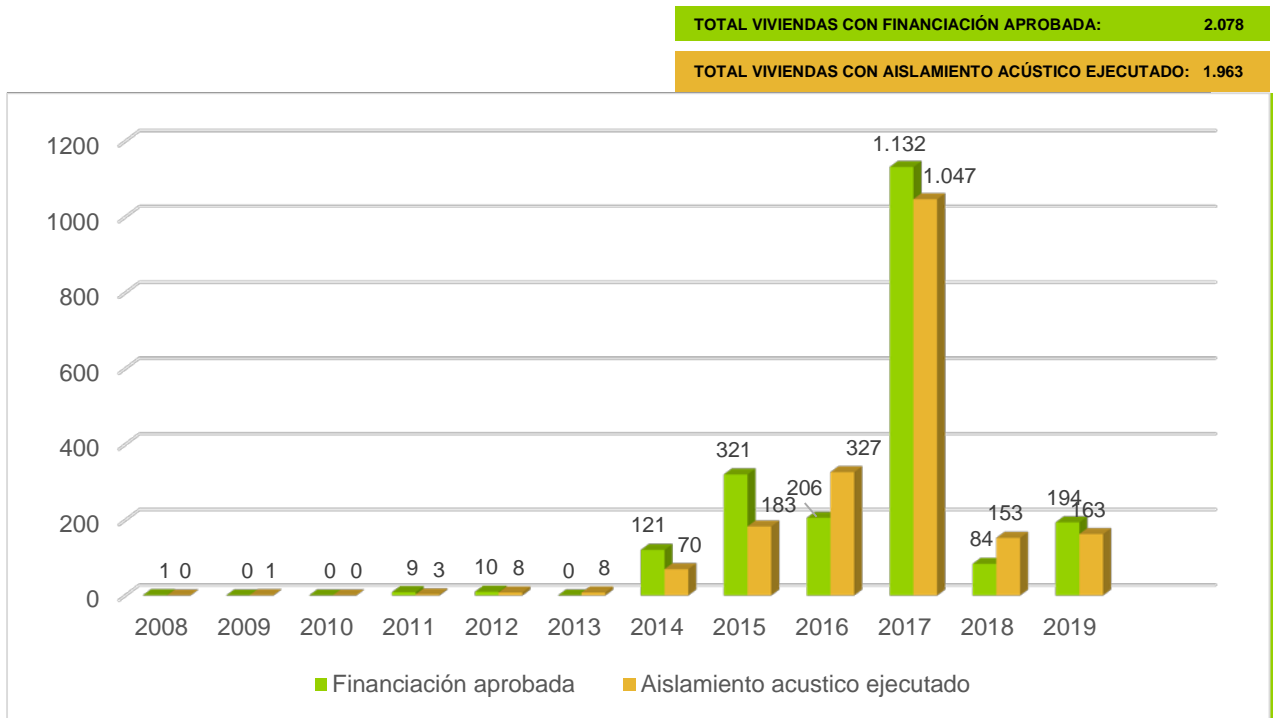

Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2008-2019)

