



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE MENORCA

Informe ejecutivo

4 de octubre de 2018

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

DIA 02/09/03 – DIA 10/08/09

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	D.I.A. 2003	D.I.A. 2009	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	8	24	32
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	7	22	29
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	7	22	29
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	5	9	14
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	5	9	14
Total de viviendas con financiación aprobada	5	9	14
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	-	5	5
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	5	4	9

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 02/09/03 – 10/08/09

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R_i = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 14}{\text{Total solicitudes recibidas: } 29}$$

48,27% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2008-2018)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 14

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 9

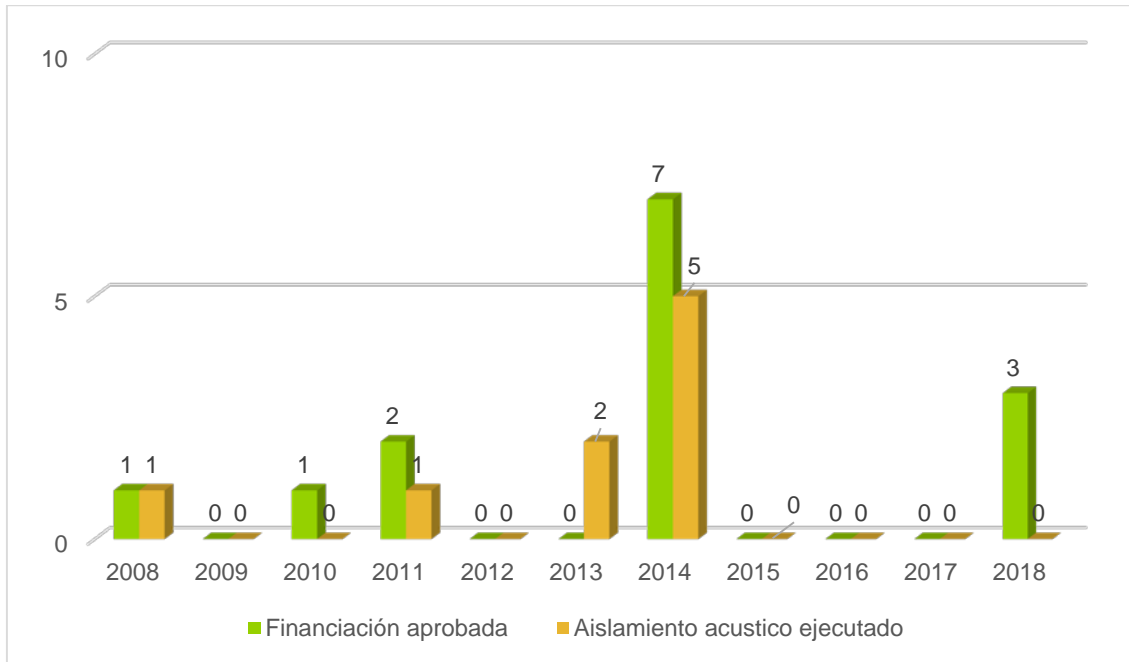

Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2012-2018)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 206,80 Mil. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 137,22 Mil. €

