

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE
TENERIFE NORTE

Informe ejecutivo

31 de diciembre de 2019

Gestión del plan de aislamiento acústico

Declaración de Impacto Ambiental 28/06/2006

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	San Cristóbal de La Laguna	Tacoronte	Tegueste	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	2.201	115	130	2.446
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.298	60	59	1.417
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.224	56	58	1.338
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.011	39	49	1.099
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	925	24	49	998
Total de viviendas con financiación aprobada	923	24	49	996
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	130	10	3	143
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	793	14	46	853

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 28/06/2006

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 996}{\text{Total solicitudes recibidas: } 1.417}$$

70,29% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2009-2019)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 996

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 853

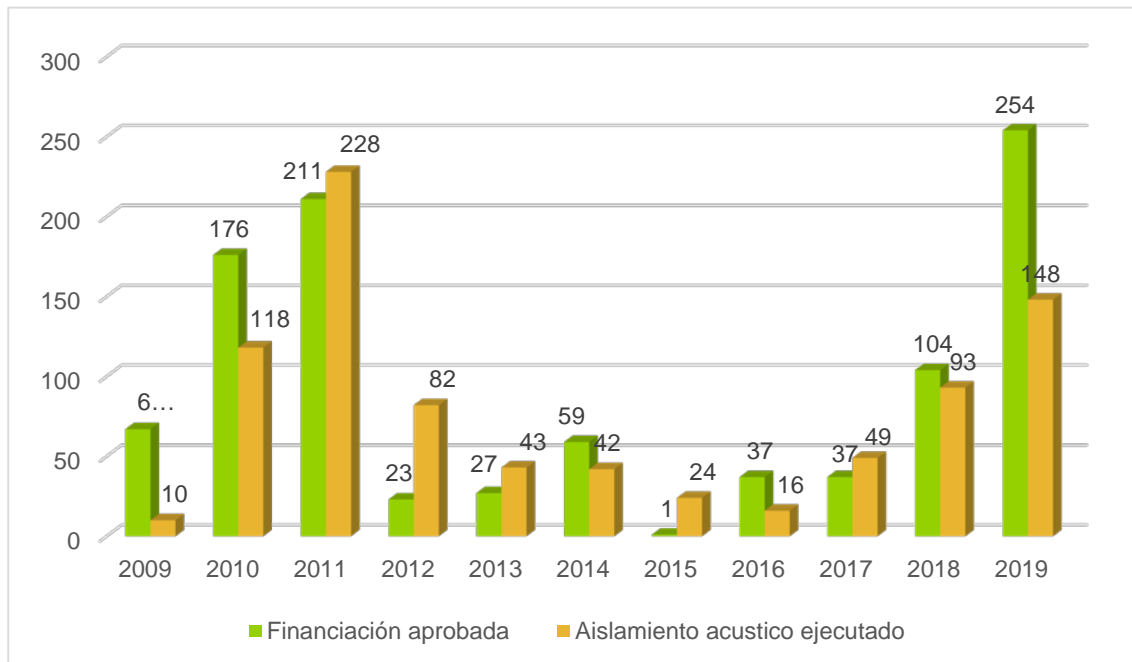

Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2009-2019)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 22,14 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 19,32 Mill. €

