



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE MÁLAGA

Informe ejecutivo

22 de julio de 2016

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

D.I.A. 2003 Y D.I.A. 2006

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	DIA 2003	DIA 2006	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	867	44	911
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	830	37	867
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	825	37	862
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	807	37	844
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	801	36	837
Total de viviendas con financiación aprobada	801	36	837
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	26	-	26
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	775	36	811

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 837}{\text{Total solicitudes recibidas: } 867}$$

96,54% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2005-2016)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 837

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 811

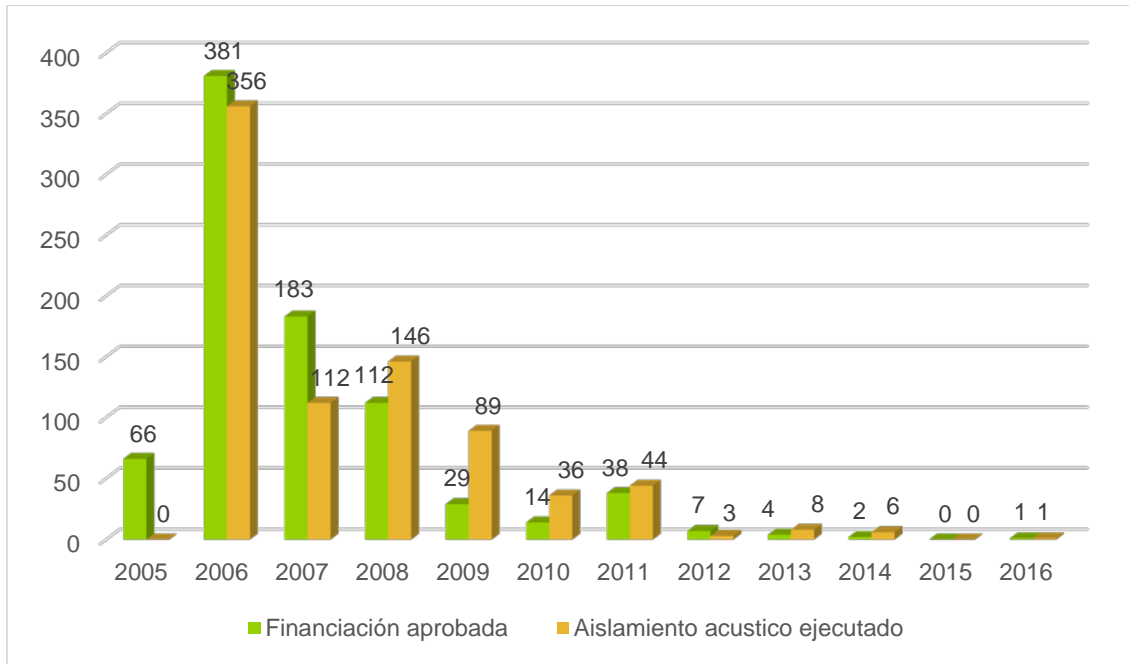

Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2005-2016)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 14,48 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 14,04 Mill. €

