



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE A CORUÑA

Informe ejecutivo

21 de abril 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Declaración de Impacto Ambiental 17/09/10

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Culleredo	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.945	1.945
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.606	1.606
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.601	1.601
Total de viviendas con medición efectuada	1.599	1.599
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	822	822
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	821	821
Total de viviendas con financiación aprobada	807	807
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	24	24
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	783	783

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2011-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 807

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 783

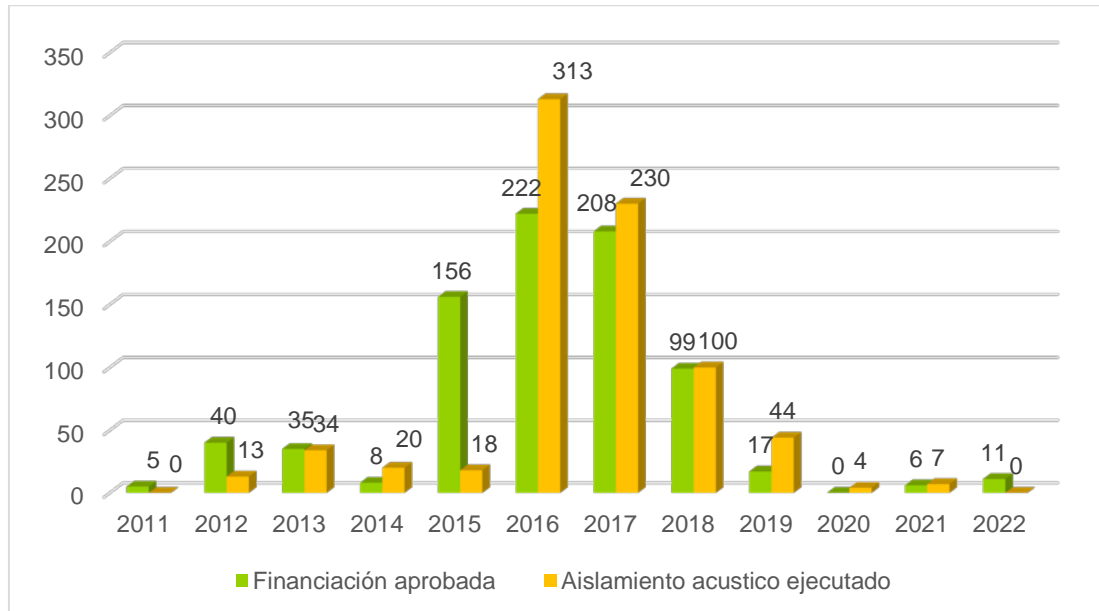

Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2011-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 7,30 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 6,15 Mill. €

