



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE MIGUEL HERNÁNDEZ

Informe ejecutivo

13 de octubre 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Declaración de Impacto Ambiental 30/09/2003 y Ampliación 2020

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	ALICANTE	ELCHE	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.291	2.561	3.852
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.291	2.162	3.453
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.291	2.059	3.350
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.291	1.945	3.236
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.290	1.935	3.225
Total de viviendas con financiación aprobada	1.290	1.933	3.223
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	-	94	94
Total de viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.290	1.839	3.129

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2006-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 3.223

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 3.129

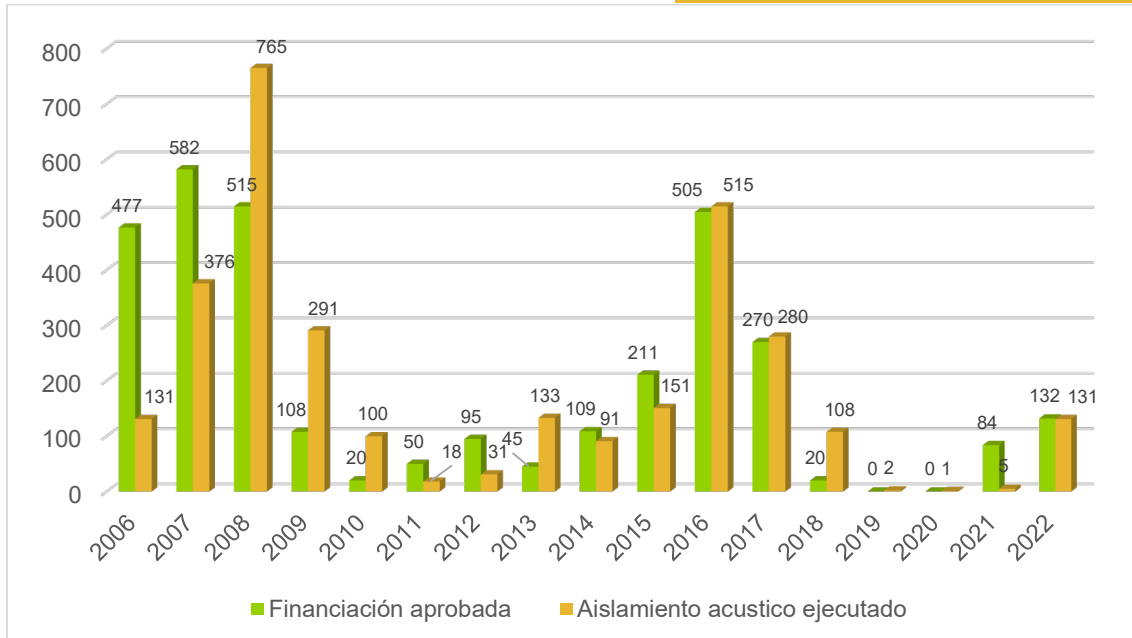

Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2006-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 44,29 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 39,12 Mill. €

