



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS

Informe ejecutivo

14 de julio de 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Declaraciones de Impacto Ambiental 1996 y 2001

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	D.I.A. 1996	D.I.A. 2001	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico			13.711
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huellaPalma	13.210	200	13.410
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	13.105	200	13.305
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	12.905	200	13.105
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	12.802	199	13.001
Total de viviendas con financiación aprobada	12.790	199	12.989
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	text-align: center;">65	text-align: center;">2	text-align: center;">67
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	text-align: center;">12.725	text-align: center;">197	text-align: center;">12.922

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2000-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 12.989

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 12.922

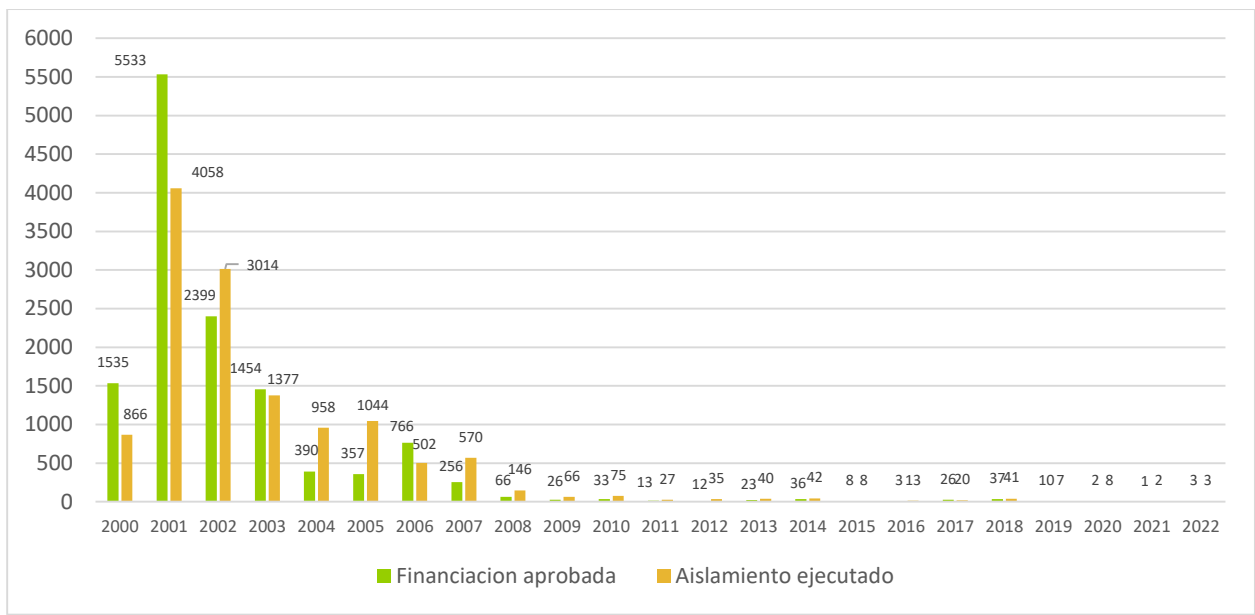

Importe aprobados y pagos efectuados en Mill.€ (2000-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS 161,29 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS 155,00 Mill. €

